

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын 2022 он ОНХСангийн
үйл ажиллагааны тайлан



Ажлын нэр: Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн танхим спорт заалыг хүзүүчээр холбох ажил

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: "Хангда" ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан 66,353,480 төгрөг

Тус ажлыг 63,801,864 төгрөг гүйцэтгэж 2022 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс суманд ирж ажиллан ашиглалтад хүлээн авсан.



Ажлын нэр: Хог зөөврийн тусгай зориулалтын автомашин

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: "ОТТО МИР" ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 40,000,000 төгрөг

Тус ажлыг 39,000,000 төгрөгөөр гүйцэтгэж 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр тээврийн хэрэгслийг ашиглалтад хүлээн авсан.



Ажлын нэр: Төвийн 6 дугаар багт Рашаантын дунд амны худаг засвар

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Ган хийц” бүлэг

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 8,554,470 төгрөг

Тус ажлыг 8,500,000 төгрөгөөр гүйцэтгэж 2022 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр худаг засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авсан



Ажлын нэр: Гамшгийн бэлэн байдлыг бэлтгэх

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Эрхэст ундарга” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 20,000,000 төгрөг

Тус ажлыг 19,500,000 төгрөгөөр гүйцэтгэж 2022 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр хамгаалах хувцас хэрэгслийг хүлээн авсан



Ажлын нэр: Энгийн уурхайн худаг засварлах

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум 1, 2, 3, 4, 5-р багууд нийт 9 энгийн худаг

Гүйцэтгэгч: Бүлгээр

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 27,000,000 төгрөг 9 бүлэг хийж гүйцэтгэж комисс хвлээн авсан.



Ажлын нэр: ЗЗББУХТ, Орон нутгийн хамтарсан гүний өрмийн худаг шинээр гаргах

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум Тагт 3-р багт

Гүйцэтгэгч: “Гранд холдинг” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 16,000,000 төгрөг




Ажлын нэр: Гүний усны хайгуул хийх

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Гидро инженер геологи” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 20,000,000 төгрөг
Тус ажлыг 19,500,000 төгрөгөөр гүйцэтгэсэн.

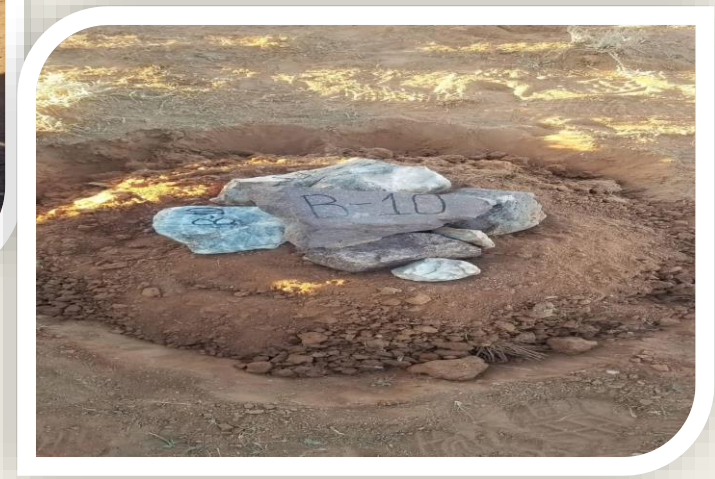

Ажлын нэр: Өвсний нөөц бүрдүүлэх

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Эм эм жи таур” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 20,000,000 төгрөг
Тус ажлыг 19,500,000 төгрөг гүйцэтгэсэн.



ХИЙГДЭЭГҮЙ АЖИЛ ТҮҮНИЙ УЧИР ШАЛТГААН:

- 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 26 ажил арга хэмжээ хийгдэхээр тусгагдсан.
- Үүнээс 19 ажил нь хийгдснээс 16 ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгсэн. 2 ажил 60-95 хувийн гүйцэтгэлтэй. 1 ажил гүйцэтгэгч компани нь шалгарсан.
- 3 нэр төрлийн ажил хийгдээгүй. Үүнд:
- 80,462,650 төгрөгийн өртөгтэй Сумын нэгдсэн хогийг Ландфиллын аргаар дарж устгах, хашаажуулах, нөөц нүх бэлтгэх ажил
- 128,000,000 төгрөгийн өртөгтэй 1-р багт гүн өрмийн худаг гаргах (Загийн усны цав, 3-р багт Орвог, 4-р багт Нанзан, 5-р багт Шар уул)
- 60,000,000 төгрөгийн Мал угаалгын банн барих ажил Буянт 1, 2, 5-р багт


Ажлын нэр: Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Алтан тариа” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 5,762,500 төгрөг

Тус ажлыг 4,960,000 төгрөгөөр гүйцэтгэсэн.

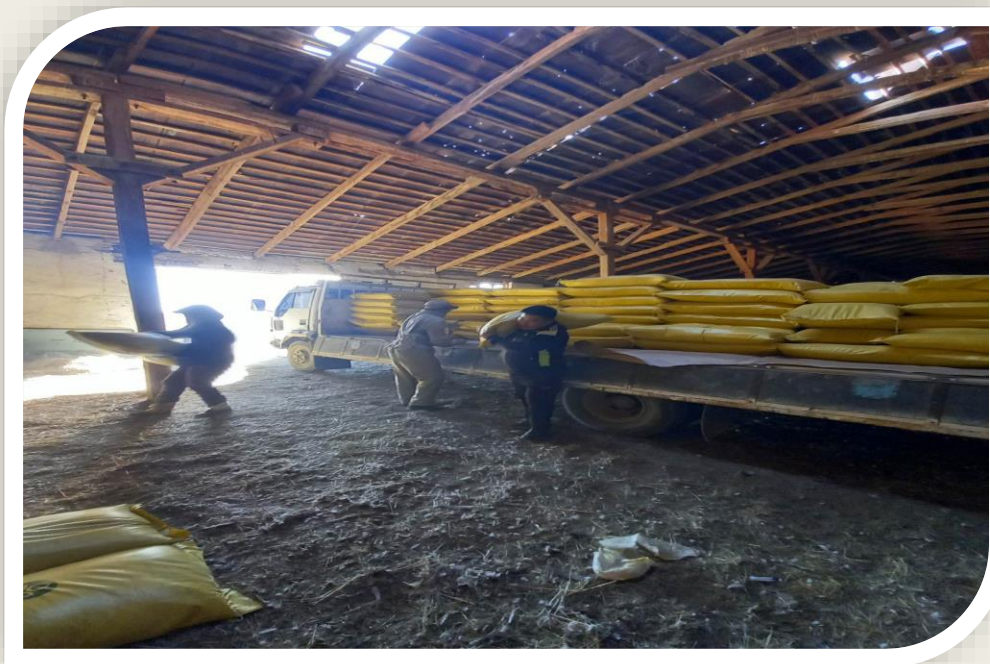


Ажлын нэр: Сумын төвийн цэвэр усан хангамжийн парк шинэчлэлийн ажил

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Мандал шилтгээн” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 189,246,779 төгрөг

Ажлын гүйцэтгэл 95%-тай явагдаж байна.

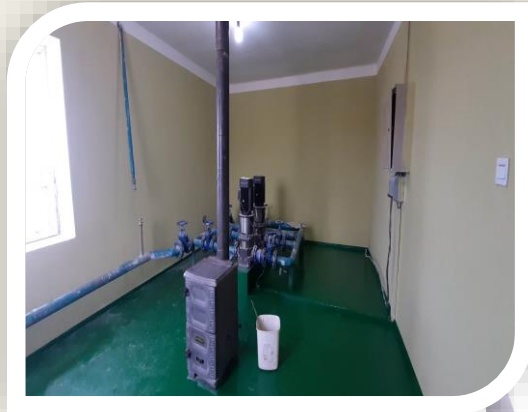

Ажлын нэр: Сумын төвийн цэвэр усан хангамжийн парк шинэчлэлийн ажил

Байршил: Дундговь аймгийн Өлзийт сум

Гүйцэтгэгч: “Роуд дэвэллопмент” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан – 166,500,000 төгрөг

Ажлын гүйцэтгэл 60%-тай явагдаж байна.



- 19,500,000 төгрөгийн өртөгтэй Спорт цогцолбор соёл амралтын хүрээлэнгийн зураг
- 19,000,000 төгрөгийн Багийн иргэдэд үйлчлэх төвийн зураг төсөв
- 8,000,000 төгрөгийн “Өлзийт сумын 7 км 0,4 квт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэлийн ажлын зураг, төсөв” боловсруулах ажлууд 100% хийгдсэн.
- СОЛГОЙН БУЛАГ ХАШИХ” 17,000,000 төгрөгийн ажил нь багийн иргэдээс цуцлах санал ирүүлсэн тул хийгдээгүй.
- 2022 онд нийт 26 ажил төлөвлөгдөж бүрэн хийгдэж биелэлт 73% байна.

**ӨЛЗИЙТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР**
